



CENTRO ARGENTINO DE INGENIEROS



Comisión de Empresas
Proveedoras de Servicios
de Ingeniería

Práctica para la Gestión Básica de Ingeniería en Proyectos

18/06/2020

Ing. Miguel Wegner, Presidente Hytech Ingeniería S.A. y Presidente Comisión CEPSI CAI

Ing. Mariano Sordelli, Experto en Sistemas de Gestión e Implementador CEPSI CAI

GESTIÓN BÁSICA DE INGENIERÍA EN PROYECTOS (GBIP)

 CENTRO ARGENTINO DE INGENIEROS	 COMISIÓN DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA SUBCOMISIÓN GBIP	Rev.2 Fecha: 08-05-19 Pág. 1 de 56
GESTIÓN BÁSICA DE INGENIERÍA EN PROYECTOS - PRÁCTICAS RECOMENDADAS		



GESTIÓN BÁSICA DE INGENIERÍA EN PROYECTOS



SUBCOMISIÓN GBIP

2	Adecuación de Formato y Anexos	08/05/2019
1	ACTUALIZACIÓN	19/02/2019
0	REVISIÓN INICIAL	16/10/2018
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA



CAPÍTULOS DE LA PRÁCTICA GBIP

1- INTRODUCCIÓN

2- OBJETIVO

3- ALCANCE

4 - INICIO DE PROYECTO – PLANIFICACIÓN

5 - PLAN DE EJECUCIÓN DE INGENIERÍA (P.E.I.)

6 - GESTIÓN DOCUMENTAL

7 - MEDICIONES DE AVANCE / REPORTING / CONTROL

8 - GESTIÓN DEL CAMBIO

9 - CIERRE DE PROYECTO

10- Anexos (16 puntos desarrollados con ejemplos/plantillas)

EMPRESAS PROMOTORAS DE GBIP



Implementación de La Práctica

Beneficios

Las estrategias identificadas en La Práctica son factores clave para el éxito de los procesos



- ✓ Aumentar el **valor** del producto/servicio entregado.
- ✓ Aumentar la **organización** interna de la empresa.
- ✓ Reducir **costos**, a lo largo de la cadena de valor, disminuyendo documentos rechazados y su consecuente retrabajo.
- ✓ Disminuir los problemas generados por el tráfico de **información** con y desde el cliente.
- ✓ Transformar procesos en **cultura** empresarial.
- ✓ Mejorar el **clima laboral** logrando que cada colaborador de un Proyecto entienda integralmente los procesos internos.
- ✓ Mejorar el **rendimiento** de las actividades a través del seguimiento de indicadores.
- ✓ Mejorar el rendimiento comercial aumentando la **reputación** de la marca.

Implementación de La Práctica

Prueba Piloto (1era etapa)

Participantes




Implementación de La Práctica

Prueba Piloto (1era etapa)

Resultados

Avance general de las Empresas en el cumplimiento de La Práctica

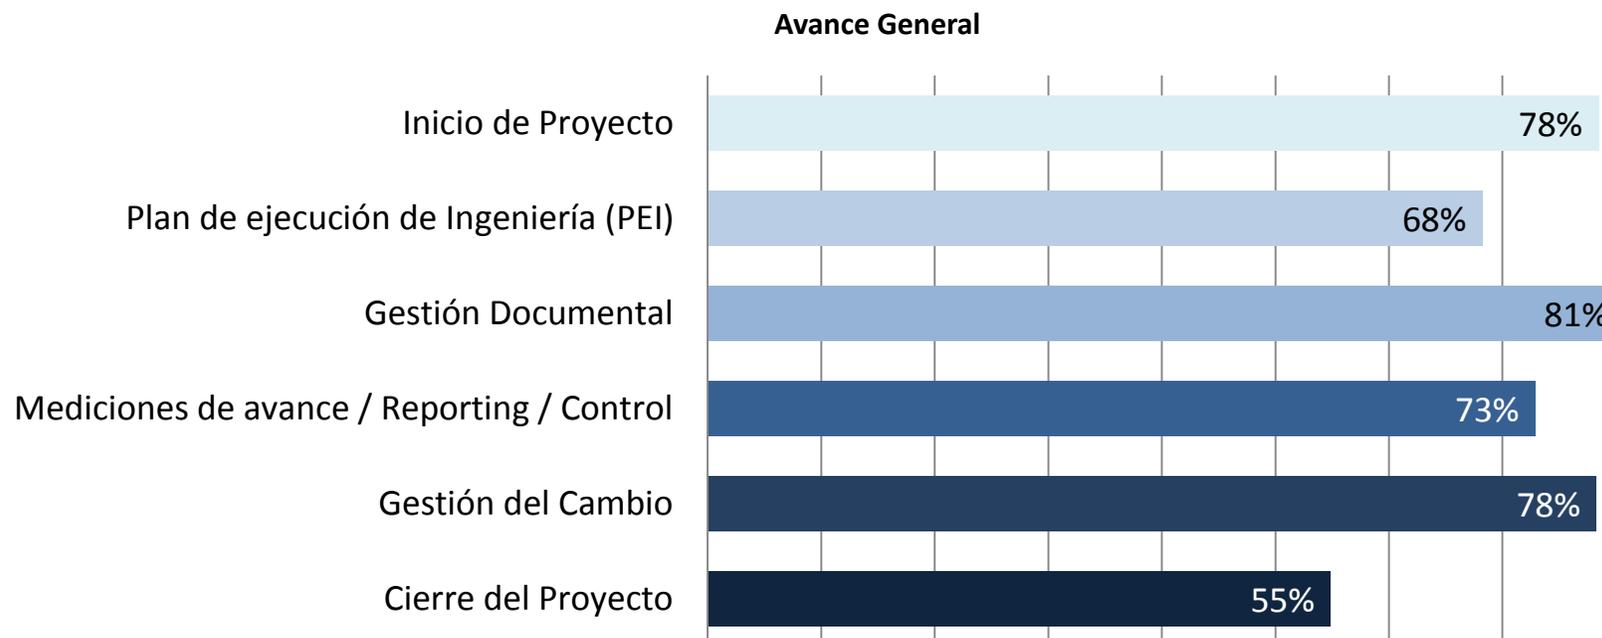


Implementación de La Práctica

Prueba Piloto (1era etapa)

Resultados

Punto de *La Práctica* donde el cumplimiento promedio fue más alto

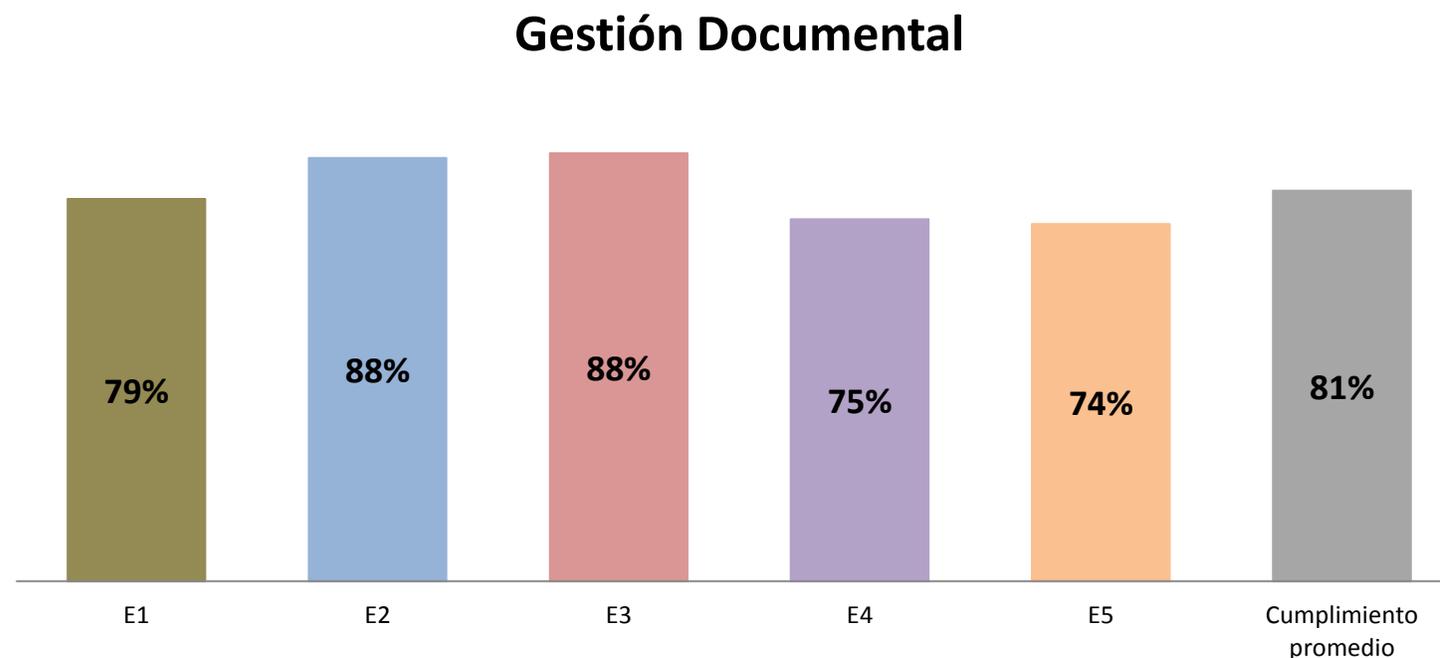


Implementación de La Práctica

Prueba Piloto (1era etapa)

Resultados

Punto de *La Práctica* donde menos se acercaron a los estándares establecidos

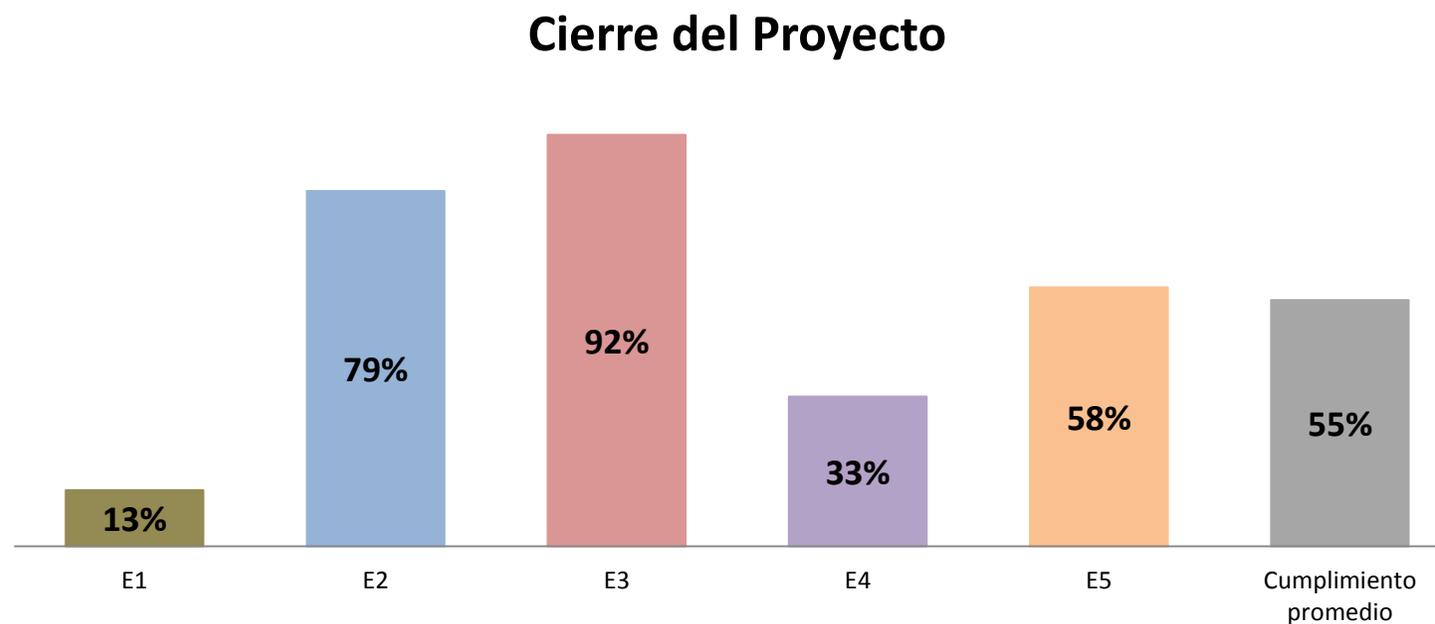

IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA

Diagnóstico y Asesoramiento

Consultoría y Asistencia Técnica

**Auditoría de
Diagnóstico
Inicial**



**Asesoramiento
online**



Requisito para acceder al servicio:
Suscripción a categoría bronce por
12 meses al CAI



IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA

Fase: Auto Evaluación + Auditoría de Diagnóstico + Implementación de Mejoras

Participantes GAPP



Mayo 2020 – Auditoría de Diagnóstico
En etapa de Implementación de mejoras



Junio 2020 – Auditoría de Diagnóstico en proceso

Actividad WEBINAR de presentación amplia de la GBIP



Próximamente!



CENTRO ARGENTINO DE INGENIEROS



**Comisión de Empresas
Proveedoras de Servicios
de Ingeniería**

¡Muchas gracias por su atención!

18/06/2020

Ing. Miguel Wegner, Presidente Hytech Ingeniería S.A. y Presidente Comisión CEPSI CAI

Ing. Mariano Sordelli, Experto en Sistemas de Gestión; Implementador CEPSI CAI
